

ZMLUVA O DIELO č. 01/03/2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Čičava
Sídlo: Obecný úrad, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Dušan Vilenik, starosta obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. arch. Drahomír Dvorjak
IČO: 00 332305
DIČ: 2020640919
IČ DPH: Neplátca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK15 0200 0000 0000 2362 0632
Telefón: +421 5744 22000
Mobil: +421 91080180
E – mail: obec@cicava.sk
www.cicava.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: JANEP s.r.o.
Sídlo: M. Benku 1449, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Bc. Lenka Pačutová, konateľ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Mgr. Tomáš Tatray
vo veciach technických: Mgr. Tomáš Tatray
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK53 0200 0000 0035 8533 3751
IČO: 44 719 361
DIČ: 2022802409
IČO DPH: SK2022802408
Telefón: 0905 565 897
Fax:
E – mail: janepsro@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu PO, oddiel: Sro, vložka č. 21499/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Zberný dvor Čičava“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo Zberný dvor Čičava bude financovaný z:
Názov žiadosti o NFP: Zberný dvor Čičava

Obec Čičava
Zberný dvor Čičava
Zmluva o dielo č. 01/03/2019

Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: **OPKZP-PO1-SC111-2017-32.**

Kód žiadosti o NFP: NFP310010P744

Operačný program Kvalita životného prostredia.

Zameranie:

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bodu 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie **Zberný dvor Čičava**
 - c) stavebného povolenia č. SP-55/697/2018-Vo (Príloha č. 5 tejto zmluvy),
 - d) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - e) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**

Termín ukončenia: **do 150 dní odo dňa začatia**

Obec Čičava
Zberný dvor Čičava
Zmluva o dielo č. 01/03/2019

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **4 pracovné dni** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Čičava, p. č. 493/2.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 41 164,58 eur
DPH 20 % 8 232,92 eur
Celková cena diela 49 397,50 eur
Slovom: Štyridsaťdeväťtisícristodevät'desiatsedem 50/100 eur
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musí byť prestavané.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 60 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzдания diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané

Obec Čičava

Zberný dvor Čičava

Zmluva o dielo č. 01/03/2019

len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatel'om a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ). Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatel'ovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ

Obec Čičava

Zberný dvor Čičava

Zmluva o dielo č. 01/03/2019

individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 38,5 %
- výrobná réžia PSV 35,2 %
- _____ - správna réžia HSV 17 %
- PSV 17 %
- VRN 0 %
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 6,5 %

8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.13. Navyše práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto

Obec Čičava

Zberný dvor Čičava

Zmluva o dielo č. 01/03/2019

okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:

10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo

10.3.2 odstúpením od zmluvy.

10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

b) Útvary následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,

d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje)
 - č. 4 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy
 - č. 5 Stavebné povolenie č. SP-55/697/2018-Vo

Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.03.2019

V Čičave, dňa 12.03.2019

zhotoviteľ
Bc. Lenka Pačutová
konateľ

JANEP s.r.o.
M. Benku 1449, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 44 719 361 • IČ DPH: SK2022802408

objednávateľ
Dušan Vilenik
starosta obce




Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zberný dvor - Čičava

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01- Sklad náradia	16 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,51
SO 02 - Oplotenie	4 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,12
SO 03 - Spevnená plocha	20 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 882,95
Celkom bez DPH	41 164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41 164,58
DPH 20% z	41 164,58					8 232,92
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						49 397,50

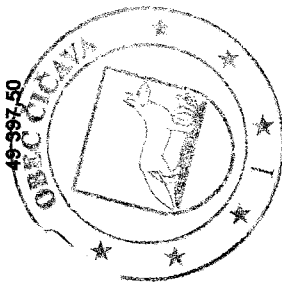

JANEČ S.R.O.
M. Benku 1449, 093 01 Vranov n.T.
IČO: 44 719 361 - IČ DPH: SK202802408

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor - Čičava	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Sklad náradia	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	JANEP s.r.o.	44 719 361	SK2022802408
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	09.01.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 123,42	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	3 003,34	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 706,73	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	2 368,02	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 201,51	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ			16 201,51
		24	DPH 20,00 % z 16 201,51
			3 240,30
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			19 441,81
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
			0,00
		27	Kízavá doložka
			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -
			0,00



ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor - Čičava

Objekt: SO 01 - Sklad náradia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JANEP s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 1. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

10 126,761 89,113

1 Zemné práce

242,281 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,280	26,915	222,856	0,000
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,280	1,475	12,213	0,000
3	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	8,280	0,871	7,212	0,000

2 Zakladanie

1 462,794 26,375

4	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,712	38,984	105,725	5,614
5	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	2,490	80,591	200,672	5,810
6	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,976	12,539	24,777	0,008
7	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	1,976	4,193	8,285	0,000
8	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí , priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	25,740	4,829	124,298	0,127
9	274271303	Murivo základových pásov debn. tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	2,780	153,814	427,603	5,886
10	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	3,710	81,317	301,686	8,740
11	279361821	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,187	1 442,501	269,748	0,191

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 005,324 10,279

12	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	13,938	55,752	0,085
13	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm hladkých, na MVC a lepidlo (100x250x500)	m2	3,000	20,250	60,750	0,226
14	342273150	Priečky z tvárnic hr. 150 mm hladkých, na MVC a lepidlo (150x250x500)	m2	12,850	26,813	344,547	1,454
15	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm, na MVC a lepidlo (300x250x500)	m3	11,900	129,771	1 544,275	8,514

4 Vodorovné konštrukcie

511,090 4,424

16	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,650	111,168	183,427	4,233
17	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	11,000	8,118	89,298	0,038
18	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	11,000	3,089	33,979	0,000
19	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,151	1 353,551	204,386	0,154

5 Komunikácie

1 241,361 43,134

20	596811340	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	17,840	13,208	235,631	2,660
----	-----------	---	----	--------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	5921957010	Platne - VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm	ks	122,650	8,200	1 005,730	40,475

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 775,597 3,898

22	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	23,880	0,940	22,447	0,006
23	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	23,880	4,868	116,248	0,122
24	621462115	Príprava vonkajšieho podkladu podhládov, penetračný náter na OSB	m2	26,570	2,998	79,657	0,011
25	621462231	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	26,570	12,442	330,584	0,077
26	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	54,960	11,095	609,781	0,159
27	612465219	Vnútorná omietka stien štuková, ručné miešanie a nanášanie, stierka hr. 3 mm	m2	23,880	6,521	155,721	0,111
28	621481119	Potiahnutie vonkajšieho podhládu sklotextílnou mriežkou	m2	26,570	5,002	132,903	0,136
29	632451056	Poter pieskocementový hr. do 55 mm	m2	35,680	9,200	328,256	3,276

8 Rúrové vedenie 874,703 0,175

30	894170051	Osadenie polyetylénového zásobníka na dažďovú vodu	ks	1,000	7,282	7,282	0,000
31	5624505121	Zásobník na dažďovú vodu 1200x1000x1160	ks	1,000	867,421	867,421	0,175

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 219,080 0,211

32	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M14/250 mm	ks	10,000	5,908	59,080	0,003
33	989542212	Osadenie a montáž hasiaceho prístroja P6	ks	4,000	40,000	160,000	0,208

99 Presun hmôt HSV 1 794,531 0,617

34	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	48,678	11,776	573,232	0,000
52	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3 m šedá	m2	43,904	6,600	289,766	0,004
53	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	43,904	0,641	28,142	0,013
60	6072627800	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m2	41,624	7,188	299,193	0,403
73	611410001900	Plastové okno 1000/1250 mm	ks	2,000	121,202	242,404	0,102
74	611420000100	Plastové vchodové dvere 1000 x 2150	ks	2,000	161,103	322,206	0,092
75	611560000400	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	2,000	17,148	34,296	0,002
76	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	ks	2,000	2,646	5,292	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 6 074,751 2,152

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 441,256 0,286

35	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	39,520	0,196	7,746	0,000
36	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	1,800	3,049	5,488	0,000
37	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	39,520	3,636	143,695	0,021
38	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	2,550	6,503	0,000
39	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	23,712	2,800	66,394	0,002
40	246170000200	Lak asfaltový v sudoch	t	0,012	1 766,445	21,197	0,012
41	628110000700	Pás asfaltový s krycou vrstvou, vložka strojná lepenka R 400/H	m2	2,070	1,438	2,977	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	628310001000	Asfaltový pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	45,448	2,841	129,118	0,193
43	283230002700	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm	m2	27,269	2,132	58,138	0,055

712 Izolácie striech, povlakové krytiny

2 540,290

0,263

44	712470070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° PVC-P fóliou prikotvením so zvarom spoju	m2	38,177	4,731	180,615	0,000
45	712973764	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene rš 200 mm	m	17,670	14,276	252,257	0,003
46	712973885	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm	m	7,530	15,528	116,926	0,002
47	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	38,177	0,486	18,554	0,000
48	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	2,350	5,523	0,000
49	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	137,437	5,800	797,135	0,104
50	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	141,360	5,800	819,888	0,107
51	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	60,240	5,800	349,392	0,046

762 Konštrukcie tesárske

1 202,254

1,008

54	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	81,910	6,507	532,988	0,021
55	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,389	27,043	37,563	0,032
56	762421312	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	26,570	10,158	269,898	0,190
57	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,500	20,250	0,000
58	762341002	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotriekovými OSB doskami na pero drážku	m2	37,840	3,734	141,295	0,000
59	6051528000	Hranol mákké rezivo - omietané smrek	m3	1,389	144,176	200,260	0,764

763 Konštrukcie - drevostavby

421,063

0,400

61	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,600	0,600	0,360	0,000
62	763138213	Podhľad SDK 12,5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD a parozabrána	m2	17,840	23,582	420,703	0,400

764 Konštrukcie klampiarske

317,157

0,018

63	764751111	Odpadová rúra kruhová D 87 mm	m	1,700	23,596	40,113	0,003
64	764751121	Spodný diel odpadovej rúry D 87 mm	ks	1,000	16,528	16,528	0,001
65	764751131	Koleno odpadovej rúry D 87 mm	ks	3,000	10,249	30,747	0,001
66	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	7,530	28,266	212,843	0,013
67	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite alebo ekvivalent	ks	1,000	13,503	13,503	0,000
68	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	1,850	3,423	0,000

766 Konštrukcie stolárske

390,248

0,003

69	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	9,000	7,105	63,945	0,002
70	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2,2 m x š. 1 m	ks	2,000	130,000	260,000	0,001
71	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	33,000	66,000	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
72	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,550	0,303	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 338,220 0,106

77	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,500	10,164	25,410	0,000
78	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,900	0,810	0,000
79	5534395741	Oceľové mreže 1000 x 1250 mm	ks	2,000	156,000	312,000	0,106

783 Nátery 302,608 0,046

80	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	88,924	3,403	302,608	0,046
----	-----------	--	----	--------	-------	---------	-------

784 Maľby 121,655 0,023

81	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	41,720	1,042	43,472	0,009
82	784452471	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	41,720	1,874	78,183	0,014

Celkom 16 201,512 91,265

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor - Čičava	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Oplotenie	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	JANEP s.r.o.	44 719 361	SK2022802408
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	09.01.2019		


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	201,32	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	309,49	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 069,40	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	499,92	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 080,12	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 4 080,12
12.01.2019		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			4 896,14
Dátum a podpis		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -
			0,00



JANEP s.r.o.
M. Benku 1449, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 44 719 361 - IČ DPH: SK2022802408

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor - Čičava

Objekt: SO 02 - Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JANEP s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 1. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 510,800 6,572

1 Zemné práce 176,080 0,000

1	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	2,790	51,425	143,476	0,000
2	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	2,790	9,340	26,059	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2,790	1,475	4,115	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,790	0,871	2,430	0,000

2 Zakladanie 226,565 6,572

5	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	2,790	81,206	226,565	6,572
---	-----------	---	----	-------	--------	---------	-------

99 Presun hmôt HSV 108,155 0,000

6	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159	t	6,209	17,419	108,155	0,000
---	-----------	-------------------------------------	---	-------	--------	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 3 569,317 13,197

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 569,317 13,197

7	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,900	0,810	0,000
8	5535850065	Brána dvojkrídlová, výška: 2,0m, šírka 3,5m	ks	1,000	459,270	459,270	0,122
9	553510024300	Príchytka pan. na stĺpik 48 mm pvc zel.	bal	51,000	5,600	285,600	0,001
10	5535850191	Stĺpik kruhový pvc zelený, d48, výška:2,5m	ks	17,000	21,000	357,000	0,072
11	5538502112	Plechový plot T29 ZN v.š. 2,0 m, včetně stĺpikov a vodorovného stuženie	m	106,000	9,840	1 043,040	11,236
12	5538502112	Panel 3D 2500x2003-4/4 zelený Ral 6005	ks	15,000	31,000	465,000	1,590
13	767916130	Montáž oplotenia z plechu profilového, včetně stĺpikov, vodorovného stuženia a plechu	m	106,000	7,362	780,372	0,170
14	767916480	Montáž oplotenia panelového, oceľového s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom na stĺpiky, výšky do 2,5 m	m	37,500	0,856	32,100	0,000
15	767916700	Osadenie stĺpika oceľového s antikoróznou úpravou s polyesterovým povlakom, výšk do 2,5 m	ks	17,000	6,849	116,433	0,007
16	767920040	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	29,692	29,692	0,000

Celkom 4 080,117 19,769

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zberný dvor - Čičava	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - Spevnená plocha	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	JANEP s.r.o.	44 719 361	SK2022802408
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	09.01.2019		


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 115,86	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	9 767,09	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 882,95	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Peciatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 20 882,95
		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			25 059,54
Dátum a podpis	Peciatka	E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa
		27	Klízáva doložka
Dátum a podpis	Peciatka	28	Zvýhodnenie + -
			0,00

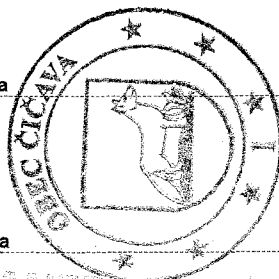

JANEP s.r.o.
M. Benku 1449, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 44 719 361 • IČ DPH: SK2022802408

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor - Čičava
Objekt: SO 03 - Spevnená plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: JANEP s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 1. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

20 882,952 454,145

1 Zemné práce

1 988,546 17,452

1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Prípatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	100,100	0,906	90,691	0,000
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	100,100	3,820	382,382	0,000
3	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	100,100	5,408	541,341	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	100,100	0,871	87,187	0,000
5	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,450	11,334	73,104	0,000
6	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,000	14,173	56,692	0,000
7	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	100,100	4,763	476,776	0,000
8	5834381200	Kamenivo hrubé 4-8	t	10,772	16,341	176,025	10,772
9	5834381200	Kamenivo hrubé 4-8	t	0,668	16,341	10,916	0,668
10	5834394500	Kamenivo hrubé 22-63	t	6,012	15,541	93,432	6,012

2 Zakladanie

187,748 3,083

11	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,300	82,591	107,368	3,034
12	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,462	12,539	30,871	0,010
13	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,462	4,093	10,077	0,000
14	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	8,000	4,929	39,432	0,040

4 Vodorovné konštrukcie

1 015,200 69,949

15	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej hr. 30 mm z kameniva ťaženého	m2	432,000	2,350	1 015,200	69,949
----	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--------

5 Komunikácie

13 116,678 332,300

16	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého hrubého veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	432,000	6,882	2 973,024	210,704
17	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2	m2	307,840	13,487	4 151,838	34,478
18	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvární (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	124,160	2,295	284,947	0,372
19	5922784400	Tvárnica betónová zatravňovačka 60x40,5x10	ks	509,000	6,118	3 114,062	29,522
20	5921952490	Dlažba - HAKA 8N alebo ekvivalent SIVÁ, 8,06 m2 /pal	m2	311,000	8,337	2 592,807	57,224

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 628,890 31,361

21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	82,000	8,870	727,340	13,491
22	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,920	90,019	442,893	10,829

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY

Popis činnosti	Deň														
	1.-10.	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	71-80	81-90	91-100	101-110	111-120	121-130	131-140	141-150
Prevzaté staveniska	X														
Objekt SO 01- Sklad náradia															
ZEMNÉ PRÁCE	X	X				X									
ZÁKLADY		X	X												
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				X	X	X	X	X							
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					X	X	X	X	X	X		X			
SPEVNENÉ PLOCHY						X					X	X	X		
POVRCHOVÉ ÚPRAVY										X	X	X	X		
POTRUBNÉ ROZVODY						X	X								
OSTATNÉ PRÁCE							X		X					X	
PRESUNY HMŔT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			X	X	X										
POVLAKOVÉ KRYTINY									X	X	X	X			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						X	X	X	X						
DREVOSTAVBY										X	X	X	X		
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ									X	X	X	X			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						X	X		X	X	X				
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE											X	X	X		
NÁTERY				X	X				X						
MALBY												X	X	X	
Objekt SO 02 - Oplotenie															
ZEMNÉ PRÁCE			X	X	X	X									
ZÁKLADY						X	X	X	X						
PRESUNY HMŔT				X	X	X	X	X	X						
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						X	X	X	X	X			X		
Objekt SO 03 - Spevnená plocha															
ZEMNÉ PRÁCE						X	X	X	X	X					

ZÁKLADY

VODOROVNÉ KONŠTRUKCE

SPEVNENÉ PLOCHY

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

Vyčistenie stavby

Odovzdanie stavby a staveniska

[illegible]

Vo Vranove nad Topľou, dňa 12.03.2019.

13.07.2019

zhotovitel'

Bc. Lenka Pačutová

konatel'

M. Banku 1449, 09301 Verona, I.

ICÖ: 44 719 351 • İÇ DPH: SK2022802408

objednatel

Dušan Vilenik

starosta obce

